



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝักขวง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลฝักขวง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝักขวงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลฝักขวง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อแสดงผลการดำเนินงานในห้วงระยะเวลา ๑ ปีงบประมาณ และเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลฝักขวง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประจวบ แร่กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝักขวง



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง
อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุดรธานี

สารบัญ

หน้า

| | |
|---|----|
| 1. โครงการที่ อปท. ดำเนินการเอง..... | 1 |
| 2. โครงการที่จ่ายเงินสะสม..... | 6 |
| 3. โครงการที่ อปท. ได้รับเงินอุดหนุน..... | 7 |
| 4. ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ..... | 13 |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565

โครงการที่ อปท. ดำเนินการเอง

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ (บาท) | ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามใน สัญญา | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินงาน | | | ผลสัมฤทธิ์ | รอบการรายงาน | |
|--|---|---------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|---|--------------|----------|
| | | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | | 6 เดือน | รอบปี 65 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | | | | | | | | | | | |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | | | | | | |
| 1 | โครงการกีฬาเด็กเล็กและครอบครัว | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | | | ✓ | - | | ✓ |
| 2 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | | | ✓ | - | | ✓ |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 685,110.00 | 492,225.00 | 492,225.00 | 192,885.00 | | ✓ | | การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ | | ✓ |
| 4 | อาหารเสริม (นม) โรงเรียน | 843,200.00 | 835,801.60 | 835,801.60 | 7,398.40 | | ✓ | | เด็กได้รับอาหารเสริม (นม) ครบ 100% | | ✓ |
| 5 | อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 188,000.00 | 150,456.80 | 150,456.80 | 37,543.20 | | ✓ | | เด็กได้รับอาหารเสริม (นม) ครบ 100% | | ✓ |
| 6 | อาหารกลางวันโรงเรียน | 1,848,000.00 | 1,780,380.00 | 1,780,380.00 | 67,620.00 | | ✓ | | เด็กได้รับอาหารกลางวันครบ 100% | | ✓ |
| รวม | | 3,597,310.00 | 3,258,863.40 | 3,258,863.40 | 338,446.60 | 0 | 4 | 2 | | | |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | | | | | | |
| 1 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 65,000.00 | 59,755.00 | 59,755.00 | 5,245.00 | | ✓ | | สัตว์ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการฉีดวัคซีนครบ 100% | | ✓ |
| รวม | | 65,000.00 | 59,755.00 | 59,755.00 | 5,245.00 | 0 | 1 | 0 | | | |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | | | | | | | |
| 1 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ | 17,000.00 | - | - | 17,000.00 | | | ✓ | - | | ✓ |
| 2 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (ชราบาล) ตำบลผักขง | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | | | ✓ | - | | ✓ |
| รวม | | 167,000.00 | - | - | 167,000.00 | 0 | 0 | 2 | | | |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | | | | | |
| 1 | โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ | 16,000.00 | - | - | 16,000.00 | | | ✓ | - | | ✓ |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565

โครงการที่ อปท. ดำเนินการเอง

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ (บาท) | ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามใน สัญญา | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินงาน | | | ผลสัมฤทธิ์ | รอบการรายงาน | |
|--|---|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--|--------------|----------|
| | | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | | 6 เดือน | รอบปี 65 |
| 2 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อแปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตร ในพื้นที่ ตำบลฝักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ (อุดหนุนสำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | | ✓ | | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มมากขึ้น | | ✓ |
| รวม | | 46,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 16,000.00 | 0 | 1 | 1 | | | |
| แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | | | | | | |
| 1 | งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทองแสนขัน) | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | - | | ✓ | | เผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมของอำเภอทองแสนขัน | ✓ | |
| 2 | งานของดีอำเภอทองแสนขัน ประจำปี 2565 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทองแสนขัน) | 65,000.00 | - | - | 65,000.00 | | | ✓ | - | | ✓ |
| รวม | | 115,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 65,000.00 | 0 | 1 | 1 | | | |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | | | | | | | | | | | |
| แผนงานรักษาความสงบภายใน | | | | | | | | | | | |
| 1 | โครงการขับเคลื่อนปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร | 24,000.00 | 20,150.00 | 20,150.00 | 3,850.00 | | ✓ | | ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและลดอุบัติเหตุ | | ✓ |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ | 37,000.00 | 33,100.00 | 33,100.00 | 3,900.00 | | ✓ | | อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ลดลง | ✓ | |
| 3 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 28,000.00 | 27,860.00 | 27,860.00 | 140.00 | | ✓ | | อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ลดลง | | ✓ |
| รวม | | 89,000.00 | 81,110.00 | 81,110.00 | 7,890.00 | 0 | 3 | 0 | | | |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | | | | | |
| 1 | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด | 8,000.00 | 7,550.00 | 7,550.00 | 450.00 | | ✓ | | เด็ก เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด | | ✓ |
| รวม | | 8,000.00 | 7,550.00 | 7,550.00 | 450.00 | 0 | 1 | 0 | | | |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565

โครงการที่ อปท. ดำเนินการเอง

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ (บาท) | ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามใน สัญญา | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินงาน | | | ผลสัมฤทธิ์ | รอบการรายงาน | |
|---|---|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|---|--------------|----------|
| | | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | | 6 เดือน | รอบปี 65 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการเมืองและบริหารจัดการที่ดี | | | | | | | | | | | |
| แผนงานบริหารทั่วไป | | | | | | | | | | | |
| 1 | โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลฝักขวง | 300,000.00 | 255,834.50 | 255,834.50 | 44,165.50 | | ✓ | | มี ส.อบต. และ นายก อบต.ฝักขวง ครบตาม จำนวน | ✓ | |
| 2 | โครงการอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน | 24,000.00 | 16,446.00 | 16,446.00 | 7,554.00 | | ✓ | | ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น | | ✓ |
| 3 | โครงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ประจำปี 2565 | 1,000.00 | 720.00 | 720.00 | 280.00 | | ✓ | | มีร้อยละการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมมากขึ้น | ✓ | |
| 4 | โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝักขวง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝักขวง | 42,970.00 | 42,370.00 | 42,370.00 | 600.00 | | ✓ | | การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีข้อทักท้วง | | ✓ |
| 5 | โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝักขวง เขตเลือกตั้งที่ 12 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง | 20,000.00 | 12,614.59 | 12,614.59 | 7,385.41 | | ✓ | | มี ส.อบต. ม.12 ครบตาม จำนวน | | ✓ |
| 6 | โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝักขวง เขตเลือกตั้งที่ 12 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง | 10,000.00 | 5,030.00 | 5,030.00 | 4,970.00 | | ✓ | | การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีข้อทักท้วง | | ✓ |
| 7 | โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล | 28,000.00 | 16,946.00 | 16,946.00 | 11,054.00 | | ✓ | | ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น | | ✓ |
| รวม | | 425,970.00 | 349,961.09 | 349,961.09 | 76,008.91 | 0 | 7 | 0 | | | |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | | | | | | | | | | | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | | | | | | |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายตุ้ย ตีเพ็ง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 | 212,000.00 | 211,000.00 | 211,000.00 | 1,000.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมพร เอี่ยมอ่อน พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 | 233,700.00 | 233,000.00 | 233,000.00 | 700.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | | ✓ |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565


โครงการที่ อปท. ดำเนินการเอง

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ (บาท) | ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามใน สัญญา | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินงาน | | | ผลสัมฤทธิ์ | รอบการรายงาน | |
|-------------|--|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--|--------------|----------|
| | | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | | 6 เดือน | รอบปี 65 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพากน้ำ หมู่ที่ 8 | 327,300.00 | 326,000.00 | 326,000.00 | 1,300.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บดอัดแน่น สายนายนกตล ปรังทอง หมู่ที่ 14 | 247,000.00 | 246,000.00 | 246,000.00 | 1,000.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 5 | โครงการก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดช่องเดียว ถนนสายป้อมตำรวจ หมู่ที่ 1 | 239,000.00 | 238,000.00 | 238,000.00 | 1,000.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 6 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านนางดวงใจ ทักษิรทอง ถึงบ้านนายทวี อินสา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 | 189,800.00 | - | - | 189,800.00 | | | ✓ | - | | ✓ |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดโคกงาม ถึงเมรุ หมู่ที่ 9 | 212,000.00 | 211,000.00 | 211,000.00 | 1,000.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 8 | โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 | 330,900.00 | - | - | 330,900.00 | | | ✓ | - | | ✓ |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายดี สีนแก้ว หมู่ที่ 12 | 329,700.00 | 329,000.00 | 329,000.00 | 700.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 10 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประปาบ่อหลวง หมู่ที่ 7 | 337,900.00 | 336,000.00 | 336,000.00 | 1,900.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 11 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 | 337,900.00 | 336,000.00 | 336,000.00 | 1,900.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 12 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขุดลอกเปิดทางน้ำห้วยปลาโก้ใต้ หมู่ที่ 4 | 200,900.00 | 200,900.00 | 200,900.00 | - | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 13 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้านโชนใต้ หมู่ที่ 2 | 351,000.00 | 351,000.00 | - | 351,000.00 | ✓ | | | - | | ✓ |
| 14 | โครงการปรับปรุงท่อกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | - | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| รวม | | 3,614,100.00 | 3,082,900.00 | 2,731,900.00 | 882,200.00 | 1 | 11 | 2 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | 8,127,380.00 | 6,920,139.49 | 6,569,139.49 | 1,558,240.51 | 1 | 29 | 8 | | | |

สรุปผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผักขวาง ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

| | | | |
|---|-----------------|--------------|---------|
| โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน | จำนวน | 38 | โครงการ |
| | งบประมาณ | 351,000 | บาท |
| อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน | 1 | โครงการ |
| คิดเป็นร้อยละ 2.63 | งบประมาณตั้งไว้ | 6,974,680.00 | บาท |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน | 29 | โครงการ |
| | งบประมาณตั้งไว้ | 6,569,139.49 | บาท |
| คิดเป็นร้อยละ 76.32 | เบิกจ่าย | 801,700.00 | บาท |
| ไม่สามารถดำเนินการได้ | จำนวน | 8 | โครงการ |
| | งบประมาณ | 801,700.00 | บาท |
| คิดเป็นร้อยละ 21.05 | | | |

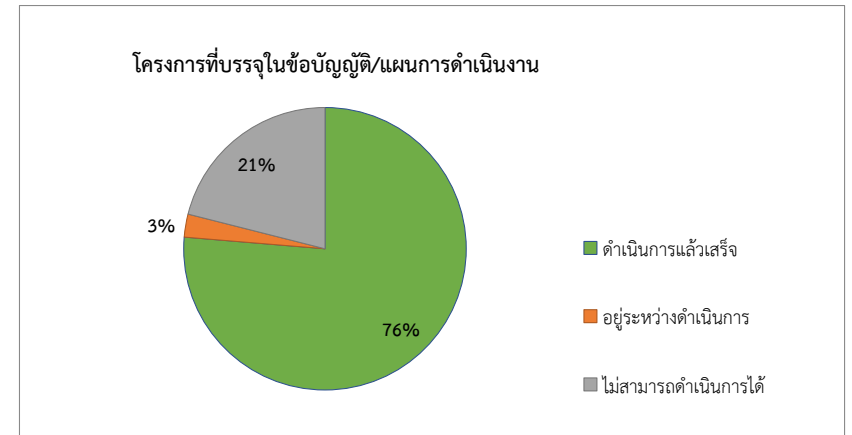

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565

โครงการที่จ่ายเงินสะสม

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ (บาท) | ก่อนหักผูกพัน/ ลงนามใน สัญญา | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินงาน | | | ผลสัมฤทธิ์ | รอบการรายงาน | |
|----------|---|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|------------|--------------|----------|
| | | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | | 6 เดือน | รอบปี 65 |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายหนองทองแดง หมู่ที่ 2 บ้านผักขวง | 360,900 | | | 360,900.00 | ✓ | | | - | | ✓ |
| 2 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิด 2 ช่อง สายห้วยปลาก่อน้ำ (จุดที่ 1) หมู่ที่ 3 บ้านวังโป่ง | 494,500 | | | 494,500.00 | ✓ | | | - | | ✓ |
| 3 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิด 2 ช่อง สายห้วยปลาก่อน้ำ (จุดที่ 2) หมู่ที่ 3 บ้านวังโป่ง | 494,500 | | | 494,500.00 | ✓ | | | - | | ✓ |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายนายสมพร เอี่ยมอ่อน หมู่ที่ 4 บ้านวังโป่ง | 222,600 | | | 222,600.00 | ✓ | | | - | | ✓ |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายร้องลึก - เขาสัก หมู่ที่ 6 บ้านร้องลึก | 488,500 | | | 488,500.00 | ✓ | | | - | | ✓ |
| 6 | โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. เพื่อการเกษตร สายห้วยผักขวง หมู่ที่ 7 บ้านปางวุ้น | 498,800 | | | 498,800.00 | ✓ | | | - | | ✓ |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายห้วยห้าสิบ หมู่ที่ 12 บ้านปู่ประจักษ์มิตร | 389,500 | | | 389,500.00 | ✓ | | | - | | ✓ |
| 8 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดช่องเดียว สายข้างเหลี่ยม บริเวณไร่นายวง จันทะวงษ์ หมู่ที่ 13 บ้านใหญ่เจริญ | 249,000 | | | 249,000.00 | ✓ | | | - | | ✓ |
| 9 | โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. เพื่อการเกษตร สายตาคำ หมู่ที่ 14 บ้านเนินทอง | 498,800 | | | 498,800.00 | ✓ | | | - | | ✓ |
| 10 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านปางวุ้นพัฒนา | 351,000 | | | 351,000.00 | ✓ | | | - | | ✓ |
| รวม | | 4,048,100.00 | - | - | 4,048,100.00 | 10 | 0 | 0 | | | |

สรุปผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการที่จ่ายเงินสะสม

โครงการที่จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง สรุปได้ดังนี้

| | | | |
|----------------------|-------|----|---------|
| อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน | 10 | โครงการ |
| คิดเป็นร้อยละ 100 | | | |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน | 0 | โครงการ |
| คิดเป็นร้อยละ 0 | | | |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565

โครงการที่ อปท. ได้รับเงินอุดหนุน

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานะการดำเนินงาน | | | ผลสัมฤทธิ์ | รอบการรายงาน | |
|---|---|-------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------|----------|
| | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | | 6 เดือน | รอบปี 65 |
| โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2564 (กันเงินไว้เบิกเหลือปี) | | | | | | | | |
| 1 | โครงการขุดลอกลำเหมืองน้ำมีด หมู่ที่ 15 บ้านโคกงาม | 495,000.00 | | ✓ | | สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น | | ✓ |
| 2 | โครงการขุดลอกห้วยร่องลึก หมู่ที่ 13 บ้านใหญ่เจริญ | 242,800.00 | | ✓ | | สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น | | ✓ |
| 3 | โครงการขุดลอกห้วยปลาฝาล่าง หมู่ที่ 12 บ้านบึงประชานิมิตร | 495,900.00 | | ✓ | | สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น | | ✓ |
| 4 | โครงการขุดลอกห้วยข้างเหลี่ยม หมู่ที่ 13 บ้านใหญ่เจริญ | 492,000.00 | | ✓ | | สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น | | ✓ |
| 5 | โครงการขุดลอกห้วยปลาฝานือ หมู่ที่ 10 บ้านเขาสัก | 495,900.00 | | ✓ | | สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น | | ✓ |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายกุล เพ็ชรดำ หมู่ที่ 2 บ้านผักขวง | 473,900.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายพรวน ต้นสุวรรณ หมู่ที่ 10 บ้านเขาสัก | 497,000.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสังเวียน พรหมโต หมู่ที่ 2 บ้านผักขวง | 497,000.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญมาก คำเพียร หมู่ที่ 3 บ้านวังโป่ง | 497,000.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญสำอาง กิ่งสีเสียด หมู่ที่ 5 บ้านน้ำหมื่นน้อย | 201,000.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานบ้านบึงใต้ หมู่ที่ 6 บ้านร่องลึก | 177,600.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยปลาก่อ (บ้านนายสายัน) หมู่ที่ 3 บ้านวังโป่ง | 284,000.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายชำตาเหมาะ หมู่ที่ 16 บ้านปางวันพัฒนา | 107,000.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | | ✓ |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565

โครงการที่ อปท. ได้รับเงินอุดหนุน

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานะการดำเนินงาน | | | ผลสัมฤทธิ์ | รอบการรายงาน | |
|----------|--|-------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--|--------------|----------|
| | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | | 6 เดือน | รอบปี 65 |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายนาลุงคอน หมู่ที่ 12 บ้านปุงประชานิมิตร | 499,000.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายซอยบ้านนายสนธิ สมบัติยา หมู่ที่ 8 บ้านวังตะเคียน | 499,700.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายนาตลุก หมู่ที่ 14 บ้านเนินทอง | 499,700.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายนางปวีณา อุ่นป่า หมู่ที่ 10 บ้านเขาสัก | 499,000.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายนายจำเนียร อูวรรณ หมู่ที่ 13 บ้านใหญ่เจริญ | 140,600.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายนาโป่ง หมู่ที่ 14 บ้านเนินทอง | 499,700.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายนายรักษันแดน หมู่ที่ 12 บ้านปุงประชานิมิตร | 146,000.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายบ้านนายผล ถิ่นอุ้น หมู่ที่ 16 บ้านปางอุ่นพัฒนา | 499,700.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายรอบบุงน้ำลาด หมู่ที่ 12 บ้านปุงประชานิมิตร | 279,800.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายลานตากลุงแทน หมู่ที่ 14 บ้านเนินทอง | 499,700.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายหลังสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 16 บ้านปางอุ่นพัฒนา | 499,700.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565

โครงการที่ อปท. ได้รับเงินอุดหนุน

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานะการดำเนินงาน | | | ผลสัมฤทธิ์ | รอบการรายงาน | |
|----------|--|-------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--|--------------|----------|
| | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | | 6 เดือน | รอบปี 65 |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายห้วยไม้แดง หมู่ที่ 14 บ้านเนินทอง | 499,700.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายห้วยอีสุก หมู่ที่ 11 บ้านน้ำหมื่นใหม่เจริญ | 499,700.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 27 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายหินออกลูก หมู่ที่ 14 บ้านเนินทอง | 499,700.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 28 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายนายเพียร เสวิสิทธิ์ หมู่ที่ 10 บ้านเขาสัก | 499,000.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายซอย 1 หมู่ที่ 12 บ้านปุงประชานิมิตร | 499,000.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 30 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายเกาะกลาง หมู่ที่ 8 บ้านวังตะเคียน | 499,700.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเด่นน้ำขำ หมู่ที่ 5 บ้านน้ำหมื่นน้อย | 497,000.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 32 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาโป่งยาง หมู่ที่ 3 บ้านวังโป่ง | 497,000.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 33 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร้องตันแกน หมู่ที่ 1 บ้านน้ำหมื่นใหญ่ | 497,000.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวน นำพา หมู่ที่ 2 บ้านผักขวง | 473,900.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 35 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายดอยก้อม หมู่ที่ 3 บ้านวังโป่ง | 499,700.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565

โครงการที่ อปท. ได้รับเงินอุดหนุน

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานะการดำเนินงาน | | | ผลสัมฤทธิ์ | รอบการรายงาน | |
|----------|--|-------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--|--------------|----------|
| | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | | 6 เดือน | รอบปี 65 |
| 36 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายแก่งท่าย่าน้อย หมู่ที่ 1 บ้านน้ำหมี่ใหญ่ | 499,700.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 37 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายคลอง ซอย 1 หมู่ที่ 4 บ้านวังโป่ง | 499,700.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 38 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายชำควายตุ้ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำหมี่ใหญ่ | 263,600.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 39 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายนาตูปด้าน หมู่ที่ 1 บ้านน้ำหมี่ใหญ่ | 499,700.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 40 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายนาผักขวง หมู่ที่ 3 บ้านวังโป่ง | 499,700.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 41 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายโนนต้นช่าน หมู่ที่ 7 บ้านปางงุ้น | 499,000.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 42 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายบนนา หมู่ที่ 5 บ้านน้ำหมี่น้อย | 499,700.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 43 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายบ้านนางैया จันทะวงศ์ หมู่ที่ 6 บ้านร้องลึก | 499,700.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 44 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายบึงหนองรี หมู่ที่ 4 บ้านวังโป่ง | 499,700.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 45 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5 บ้านน้ำหมี่น้อย | 499,700.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 46 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายห้วยขุนลาด หมู่ที่ 5 บ้านน้ำหมี่น้อย | 499,700.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565

โครงการที่ อปท. ได้รับเงินอุดหนุน

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานะการดำเนินงาน | | | ผลสัมฤทธิ์ | รอบการรายงาน | |
|----------|--|-------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--|--------------|----------|
| | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | | 6 เดือน | รอบปี 65 |
| 47 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายห้วยจันทร์ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำหมื่นใหญ่ | 499,700.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 48 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายป่าช้า หมู่ที่ 2 บ้านผักขวง | 499,600.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 49 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายห้วยแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านวังโป่ง | 499,000.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 50 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายห้วยปลาก่อ หมู่ที่ 3 บ้านวังโป่ง | 161,800.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 51 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายห้วยผักขวง หมู่ที่ 7 บ้านปางวุ้น | 499,000.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 52 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายห้วยแล้ง หมู่ที่ 5 บ้านน้ำหมื่นน้อย | 499,700.00 | | | ✓ | - | | ✓ |
| 53 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายอ่างเก็บน้ำห้วยขุนลาด หมู่ที่ 2 บ้านผักขวง | 499,000.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| 54 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายห้วยไม้สัก หมู่ที่ 4 บ้านวังโป่ง | 499,700.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| | รวม | 23,897,500.00 | 0 | 53 | 1 | | | |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565

โครงการที่ อปท. ได้รับเงินอุดหนุน

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานะการดำเนินงาน | | | ผลสัมฤทธิ์ | รอบการรายงาน | |
|---|--|----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------|----------|
| | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | | 6 เดือน | รอบปี 65 |
| โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 | | | | | | | | |
| 1 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรชนิดให้น้ำล้นผ่าน ห้วยขุนลาด หมู่ที่ 2 บ้านผักขวง | 700,000.00 | ✓ | | | มีแหล่งกักเก็บน้ำ | | ✓ |
| 2 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรชนิดให้น้ำล้นผ่าน ห้วยปลาก่อ หมู่ที่ 3 บ้านวังโป่ง | 808,500.00 | ✓ | | | มีแหล่งกักเก็บน้ำ | | ✓ |
| 3 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรชนิดให้น้ำล้นผ่าน ห้วยน้ำหมื่นน้อย หมู่ที่ 5 บ้านน้ำหมื่นน้อย | 808,500.00 | ✓ | | | มีแหล่งกักเก็บน้ำ | | ✓ |
| 4 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรชนิดให้น้ำล้นผ่าน ห้วยผักขวง หมู่ที่ 7 บ้านปางวุ้น | 700,000.00 | ✓ | | | มีแหล่งกักเก็บน้ำ | | ✓ |
| 5 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรชนิดให้น้ำล้นผ่าน ฝายน้ำมิด หมู่ที่ 9 บ้านโคกงาม | 700,000.00 | ✓ | | | มีแหล่งกักเก็บน้ำ | | ✓ |
| 6 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรชนิดให้น้ำล้นผ่าน ห้วยทับยอล่าง หมู่ที่ 10 บ้านเขาสัก | 808,500.00 | ✓ | | | มีแหล่งกักเก็บน้ำ | | ✓ |
| 7 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรชนิดให้น้ำล้นผ่าน ห้วยปลาปลาล่าง หมู่ที่ 12 บ้านบุงประชานิมิตร | 700,000.00 | ✓ | | | มีแหล่งกักเก็บน้ำ | | ✓ |
| 8 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรชนิดให้น้ำล้นผ่าน ห้วยโคกเทศ หมู่ที่ 13 บ้านใหญ่เจริญ | 808,500.00 | ✓ | | | มีแหล่งกักเก็บน้ำ | | ✓ |
| 9 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรชนิดให้น้ำล้นผ่าน ห้วยผักขวง หมู่ที่ 14 บ้านเนินทอง | 700,000.00 | ✓ | | | มีแหล่งกักเก็บน้ำ | | ✓ |
| 10 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรชนิดให้น้ำล้นผ่าน ลำเหมืองน้ำมิด หมู่ที่ 15 บ้านโคกงาม | 700,000.00 | ✓ | | | มีแหล่งกักเก็บน้ำ | | ✓ |
| 11 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรชนิดให้น้ำล้นผ่าน ห้วยผักขวง หมู่ที่ 16 บ้านปางวุ้นพัฒนา | 700,000.00 | ✓ | | | มีแหล่งกักเก็บน้ำ | | ✓ |
| รวม | | 8,134,000.00 | 11 | 0 | 0 | | | |
| โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2565 | | | | | | | | |
| 1 | โครงการเสริมผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE สาย อด.3052 บ้านร้องลึก - เขาสัก หมู่ที่ 10 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ | 5,370,000.00 | | ✓ | | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | | ✓ |
| รวม | | 5,370,000.00 | 0 | 1 | 0 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | 29,267,500.00 | 0 | 54 | 1 | | | |

สรุปผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลฝักขวง สรุปได้ดังนี้

| | | | |
|--|-------|----|---------|
| โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2564 (กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี) | จำนวน | 54 | โครงการ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน | 53 | โครงการ |
| คิดเป็นร้อยละ 98.15 | | | |
| ไม่สามารถดำเนินการได้ | จำนวน | 1 | โครงการ |
| คิดเป็นร้อยละ 1.85 | | | |
| โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 | จำนวน | 11 | โครงการ |
| อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน | 11 | โครงการ |
| คิดเป็นร้อยละ 100 | | | |
| โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2565 | จำนวน | 1 | โครงการ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน | 1 | โครงการ |
| คิดเป็นร้อยละ 100 | | | |

ปัญหาและอุปสรรค

1. ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้ไม่ดำเนินการจัดทำโครงการในข้อบัญญัติได้ทุกโครงการ
2. ปัญหาภัยธรรมชาติ อาทิ น้ำท่วม ลมพายุ ส่งกระทบประชาชนในพื้นที่ และสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้ต้องมีการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งในบางครั้งไม่สามารถกระทำได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากปัญหาจากกฎ ระเบียบ ที่มีความซับซ้อน และบุคลากรที่ไม่เพียงพอ
3. มีการโอนงบประมาณเพิ่ม โอนลด และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวนหลายครั้ง และอนุมัติงบประมาณในช่วงท้ายปีงบประมาณทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณนั้น ทำให้มีจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวนหลายโครงการ
4. การดำเนินการโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีห้วงระยะเวลาดำเนินการจำกัดด้านฤดูกาล อาทิ ฤดูฝน และฤดูเก็บเกี่ยว ส่งผลให้เครื่องจักรขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการได้

ข้อเสนอแนะ

1. องค์การบริหารส่วนตำบลฝักขวง ควรกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการจัดทำโครงการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามแผนการดำเนินงานประจำปี
2. มีวางแผนการดำเนินการป้องกันเหตุสาธารณภัยต่างๆ ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที
3. พิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่
